



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CEA-CON-EST-LP-017-19

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, PRIMERA ETAPA (HINCADO) FRENTE 2, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), Ubicada en la Calle Brasília No. 2970, Col. Colomos Providencia, en GuacalaJoria, Jalisco, siendo las 11:00 HORAS, del día 16 (DIECISEIS) DE ABRIL DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Acto que se formula con fundamento en los artículos 43 Fracción I y 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo las 11:00 HORAS para constatar la realización de la junta convocada por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la Dirección Técnica de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:

NOTA ACLARATORIA 1: El tramo a cual se hace referencia en esta licitación es el indicado con el nombre de TRAMO - 04 en el archivo digital "COLECTOR DEL VALLE_PLANO 11 AVE" entregado en el paquete de licitación.

NOTA ACLARATORIA 2: A petición de los contratistas participantes se modifica la fecha de presentación y apertura para el día 02 de mayo del 2019 a las 12:00 horas y el nuevo periodo de ejecución será del 29 de mayo del 2019 al 08 de diciembre del 2019.

En las bases dice:

Fecha de Inicio: 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE)



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-017-19

Terminación: 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).
Plazo: 194 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO) Días naturales

Y con la modificación debe decir:

Fecha de Inicio: 29 (VEINTINUEVE) DE MAYO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).
Terminación: 08 (OCHO) DE DICIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).
Plazo: 194 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO) Días naturales

EMPRESA: INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA:

En la partida Hincado de Tuberías, concepto CEA-012 el tubo solicitado "NO CUENTA CON GRASERAS", las graseras son necesarias para la lubricación de bentonita y se deslice más fácil el tubo.

RESPUESTA:

Se deberá considerar el tubo con grasera en el procedimiento constructivo según sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el cual deberá coordinarse con el proveedor de la tubería para el suministro del mismo.

Deberá considerarse este ítem dentro del concepto CEA-012.

PREGUNTA:

En la partida de Hincado de Tuberías, concepto CEA-013, Estaciones Intermedias Macho-Macho y Macho-Rebañado, en catálogo esta por metro lineal ¿es más fácil que se solicite por pieza, se puede cambiar la unidad? Ya que por metro no se sabe cuántas piezas son.

RESPUESTA:

Se deberá pegar a la unidad marcada en el catálogo de conceptos.

EMPRESA: Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1.- Derivado de las fechas y celebración de la Semana Santa. Solicitamos respetuosamente que se dé una prórroga para la adquisición de las bases de 15 días.

RESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta nota

PREGUNTA:

2. Solicitamos que el registro del padrón de contratista de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se permita entregar en el momento de la entrega de la



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-017-19

propuesta y no como condición para la adquisición de las bases.

RESPUESTA: En base al artículo 47 numeral 1 fracción III de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice "Las condiciones contenidas en la convocatoria no podrán ser negociadas".

PREGUNTA:

3.- Derivado de las fechas y celebración de la Semana Santa y a fin de poder realizar un estudio completo de la propuesta. Solicitamos respetuosamente que se dé una prórroga para la entrega de las propuestas de 1 mes calendario (24 de mayo 2019)

RESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta nota

PREGUNTA:

4.- Solicitamos el estudio de mecánica de suelos, a fin de poder valorar los riesgos previsible en cuanto al tipo de suelo y al grado de dificultad para su excavación, en la ejecución del mismo túnel y así poder valorar adecuadamente la propuesta.

RESPUESTA: Dicho estudio forma parte del paquete de licitación que se les proporciona una vez inscritos

PREGUNTA:

5.- En caso de requerirse, ¿Los permisos de desvíos eléctricos y obras instaladas serán tramitados por CLA?

RESPUESTA: Los permisos serán tramitados por el contratista con apoyo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

EMPRESA: Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1.- ¿El trazo donde se alzará el proyecto, así como sus accesos está liberado en su totalidad?

RESPUESTA: El sitio de los trabajos se encuentra liberado en su totalidad.

PREGUNTA:

2.- ¿Para los trabajos de anclado de tuberías, se podrá trabajar las 24 horas del día o se tiene alguna restricción con el horario de trabajo?



Comisión Estatal del Agua Jalisco

Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Dirección Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-017-19

RESPUESTA: El sitio de los trabajos se encuentra sin restricciones de horario.

PREGUNTA:

3.- En base al concepto de "acarreos en camión en volteo a km subsiguiente de material producto de excavaciones y/o desazolves." entendamos que se encuentra con un banco de tiro designado para el material mencionado ¿Se podría proporcionar índice o nombre de banco y de existir una ruta definida para el traslado se podría proporcionar esta?

RESPUESTA: La empresa que resulte adjudicada en conjunto con el supervisor asignado definirá el banco de tiro.

PREGUNTA:

4.- Con la finalidad de hacer una evaluación de proyecto y presentar una propuesta a fin a la importancia de este, solicitamos una prórroga de 15 días para la presentación y apertura de la propuesta.

RESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta acta.

PREGUNTA:

5.- En relación al plazo de ejecución de 94 días naturales indicado en las mencionadas bases y derivado de la cantidad de lumbreras a considerarse en el proyecto, los tiempos de preparación previos al hincado en cada lumbrera, el hincado de los tramos y finalmente la construcción de las cajas de visita, además del periodo de lluvias en el que se llevará a cabo la construcción, solicitamos se use la posibilidad de ampliar dicho tiempo.

RESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta acta.

EMPRESA: ZINZANJA, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1.- ¿El contratista podrá modificar la geometría de las lumbreras de cuadradas/rectangulares o circulares?

RESPUESTA: Si, de acuerdo al proceso constructivo particular de hincado.

PREGUNTA: Solicitamos se aclare si la tubería para el colector El Valle es tubería de concreto reforzado grado 3 de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-C-102 CNNCCS-2011 para hincado (Plano Espesor)



Comisión Estatal del Agua Jalisco

Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Dirección Técnica

Licitación Pública Nacional
CEA-CON-EST-LP-017-19

RESPUESTA.

Dice: CEA-012: SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO DE CONCRETO REFORZADO GRADO III DE 84" (213 CM DE DIAMETRO) CON JUNTA HERMÉTICA, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 A 2.5 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS Y VIOLA DE ACERO A TODO ESPESOR 3/8" CON CARGADOR TIPO DEHA PARA MANIOBRA INCLUYE SUMINISTROS, EMPAQUES, LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. CERTIFICADO DE NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-C-402.

Debe decir: CEA-012 SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO DE CONCRETO REFORZADO GRADO III DE 84" (213 CM DE DIAMETRO) CON JUNTA HERMÉTICA, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 A 2.5 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS Y VIOLA DE ACERO A TODO ESPESOR 3/8" CON CARGADOR TIPO DEHA PARA MANIOBRA INCLUYE SUMINISTROS, EMPAQUES, LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. CERTIFICADO DE NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-C-402-CONNOCÉ-2011 PARA HINCADO (PLENO ESPESOR).

Dice: CEA-013: JUEGO DE ESTACION INTERMEDIA TIPO MACHO-REBAJADO Y MACHO-MACHO DE CONCRETO REFORZADO JUNTA HERMÉTICA DE 213 CM DE DIAMETRO GRADO 3, CON REFUERZO ESPECIAL RECUBRIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 A 2.5 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS Y VIOLA DE ACERO PARA HINCADO A TODO ESPESOR 3/8". CON CARGADORES TIPO DEHA PARA MANIOBRAS. INCLUYE SUMINISTROS, EMPAQUES, LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. CERTIFICADO DE NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-C-402.

Debe decir: CEA-013 JUEGO DE ESTACION INTERMEDIA TIPO MACHO REBAJADO



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-017-19

Y MACHO-MACHO DE CONCRETO REFORZADO JUNTA HERMÉTICA DE 213 CM DE DIAMETRO GRADO 3, CON REFUERZO ESPECIAL, RECOBRIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 A 2.5 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS Y VIROLA DE ACERO PARA HINCADO A TODO ESPESOR 3/8", CON CARGADORES TIPO DENA PARA MANIOBRAS. INCLUYE SUMINISTROS, EMPAQUES, LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO, CERTIFICADO DE NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-C-402-ONNOCCE-2011 PARA HINCADO (PLENO ESPESOR).

PREGUNTA: Solicitamos el estudio de mecánica de suelos completo que incluya por lo menos resistencia a compresión de carga, cohesión, contenido de humedad, estratigrafía, granulometría y de ser posible la permeabilidad en los casos de que se encuentren estratos de arena, arena limosa o arena arcillosa, pruebas de laboratorio y reportes de campo, a fin de poder valorar los riesgos previsible en cuanto al tipo de suelo y al grado de dificultad para su excavación y valorar cabalmente la propuesta.

RESPUESTA: Dichos estudios forman parte de paquete de licitación que se les proporcionará una vez inscritos

PREGUNTA: En relación al cálculo del FASAR se solicita se aclare si se usara la UMA o el SMGDF?

RESPUESTA: Para los cálculos de FASAR se utilizará la UMA, como se indica en las Bases de Licitación.

PREGUNTA: Solicitamos para la preparación de la propuesta económica se proporcionen ejemplos hipotéticos de llenado de los documentos referentes a Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Factor de Salario Real, Análisis de Incentivos, Análisis del Costo por Financiamiento y Análisis de los Cargos Adicionales

RESPUESTA: Se anexan las Guías de Llenado en los Anexos a las Bases de Licitación.

PREGUNTA: Con el objetivo de estar en igualdad de condiciones todos los proponentes solicitamos nos indique el número de usos que se deberá considerar para el ademe metálico de las luminarias



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-017-19

RESPUESTA: Se deberán considerar los usos pertinentes y prorratear los desperdicios necesarios por cortes para la correcta ejecución de los trabajos.

EMPRESA: Acuanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1.- ¿Para el traslado de tubería y maquinaria al sitio de los trabajos está considerada alguna partida para los caminos de acceso a se tendrá que considerar en los indirectos?

RESPUESTA: Deberá de ser considerado en el cálculo de indirectos

2.- ¿Cada empresa se hará responsable de su tramo para dar acceso a los tramos intermedios?

RESPUESTA: Si cada empresa deberá de hacerse responsable de su tramo para los accesos hasta el mismo.

EMPRESA: Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1.- ¿La tubería tiene que ser de alguna marca en específico, es libre o similar?

RESPUESTA: No, solo deberá cumplir con la normatividad establecida en el catálogo de conceptos, NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-C-402-UNNCOE-2011 tubo de concreto reforzado espesor completo para hincar.

EMPRESA: Construcciones e Ingeniería Costa Alegre, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1.- ¿En el concepto de tubo, menciona "unión de tubos mediante banda de polietileno de alta densidad del mismo espesor del tubo fijada por termo fusión y/o extrusión"; se debe aclarar si la junta es fijada por termofusión y extrusión, que es el procedimiento normal y quitar el "y/o" ya que de esta manera queda al criterio de contratista la forma de fijar la banda de PAD?

RESPUESTA:

Dice:

CEA-DIA: HINCADO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 M DE DIÁMETRO INTERIOR EN MATERIAL TIPO I Y II, CON VIRCHA DE ACERO 3/8" A TODO ESPESOR Y RECURRIMIENTO PAD. INCLUYE ACARREOS Y BATAJO DE TUBERÍA AL FONDO DE LA LUMBRERA, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO, CORTE DE TABLA ESTACA PARA PASO DE TUBO, INSTALACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DEL SISTEMA



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-017-19

DE HINCADO COMPUESTO POR ESCUDO EXCAVADOR GIRATORIO, UNIDAD DE TRANSPORTE CON GÓNDOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A BASE DE DESLIZAMIENTO, EMPUJADOR DE TUBERÍA, UNIDAD DE POTENCIA CON GATOS HIDRÁULICOS PARA EMPUJE CON CAPACIDAD PARA HACER LOS TRABAJOS INHERENTE AL PROYECTO, TREN DE HINCADO, EXTRACTOR DE AIRE CONTAMINADO, PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GRÚA TIPO TODO TERRENO DE CAPACIDAD PARA LOS TRABAJOS, BOMBA DE INYECCIÓN DE BENTONITA, NIVEL AUTOMÁTICO DE RAYO LÁSER, BOMBA SUMERGIBLE DE 6" PARA AGUAS FREATIVAS, UNIDAD HIDRÁULICA DE ENFRIAMIENTO, EQUIPO DE CORTE, SOLDADURAS, EXTRACCIÓN DE REZAGA DEPOSITADA A 10.00 M DEL EJE DE LA LUMBRERA, FLETES, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PERSONAL OPERATIVO, LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE COLOCACIÓN, HINCADO DE TUBERÍA, EMPAQUES HERMÉTICOS, JUNTEO DE TUBOS MEDIANTE BANDA DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO ESPESOR DEL TUBO, FIDADA POR TEMOFUSION Y/O EXTRUSION, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Debe incluir: CEA-014. HINCADO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 M DE DIÁMETRO INTERIOR EN MATERIAL TIPO I Y II CON VIROLA DE ACERO 3/8" A TODO ESPESOR Y RECUBRIMIENTO PAD INCLUYE ACARREOS Y BAJADO DE TUBERÍA AL FONDO DE LA LUMBRERA, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO, CORTE DE TABLAESTACA PARA FASE DE TUBO, INSTALACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DEL SISTEMA DE HINCADO COMPUESTO POR ESCUDO EXCAVADOR GIRATORIO, UNIDAD DE TRANSPORTE CON GÓNDOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A BASE DE DESLIZAMIENTO, EMPUJADOR DE TUBERÍA UNIDAD DE POTENCIA CON GATOS HIDRÁULICOS PARA EMPUJE CON CAPACIDAD PARA HACER LOS TRABAJOS INHERENTE AL PROYECTO, TREN DE HINCADO, EXTRACTOR DE AIRE CONTAMINADO, PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GRUA TIPO TODO TERRENO DE CAPACIDAD PARA LOS TRABAJOS, BOMBA DE INYECCIÓN DE BENTONITA, NIVEL AUTOMÁTICO DE RAYO LÁSER, BOMBA SUMERGIBLE DE 6" PARA AGUAS FREATIVAS, UNIDAD HIDRÁULICA DE ENFRIAMIENTO, EQUIPO DE CORTE, SOLDADURAS, EXTRACCIÓN DE REZAGA DEPOSITADA A 10.00 M DEL EJE DE LA LUMBRERA, FLETES, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PERSONAL OPERATIVO, LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE COLOCACIÓN, HINCADO DE TUBERÍA, EMPAQUES HERMÉTICOS, JUNTEO DE TUBOS MEDIANTE BANDA DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO ESPESOR DEL TUBO, FIDADA POR TEMOFUSION Y EXTRUSION, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-07-19

PREGUNTA:

2.- "Acorreo y bajado"... ¿los acorreo se refiere a los acorreo al sistema de hincado entre lumbreros o a los acorreo de la tubería de concreto de un almacén provisional al sótano de la lumbrera provisional de empuje?

RESPUESTA: Los acorreo deberán de ser considerados para los materiales, equipo y herramientas necesarias para realizar el hincado de la tubería concepto CEA-074 de catálogo.

EMPRESA: Desarrolladora GLAR, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1.- Para los tramos que quedan intermedios a los accesos, nos parece insuficiente y que se obstruiría un tramo con otro en las diferentes actividades a realizar ¿ Se harán nuevos accesos o de qué manera se resolverá esta situación?

RESPUESTA: Si, considera un acceso independiente deberá ser considerado en el análisis de sus indirectos.

ACUERDOS

Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.

La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo completo de trabajo.

Para este procedimiento se permitirá subcontratar las partidas que en el catálogo de conceptos tienen el título de "Hincado de tuberías" y "Cajas lumbreras de concreto".

Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo considerando los materiales, mano de obra y maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEA-CON-EST-LP-017-19

- trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, será motivo de descalificación de su propuesta.
5. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios para la elaboración de los trabajos puestos en obra tomando en cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
 6. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para la ejecución de los trabajos.
 7. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE3) se presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.
 8. Deberán considerar los señalamientos, rótulo informativo de la descripción de la obra en construcción, trámites y equipo de protección necesario para la obra, durante toda su ejecución, mismo que deberán ser considerados dentro de sus indirectos.
 9. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
 10. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor, debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la dirección de costos de la Dirección de presupuestos y contratos.



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CEA-CON-EST-LP-017-19

11. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acastillado de la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de compactación requerido en el concepto a ejecutar.

12. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los trabajos, en el entendido que el contratista deberá considerar el alcance de estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a efectos de garantizar que al final de la ejecución de los trabajos el sitio intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas.

13. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.

Una vez leída la presente se cierra siendo las 12:00 HORAS del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.





Comisión Estatal del Agua Jalisco

Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Dirección Técnica

Licitación Pública Nacional
CEA-CON-EST-LP-017-19

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.


Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y
Contratación de Obra Pública. (CEA)


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director Área Construcción
Dirección Técnica. (CEA)


Ing. Margarita Castillo de la Peña
Director de Área de Proyectos de Agua Potable. (CEA)

Empresas Participantes

[Redacted]		
1	ZINZANJA S.A-DE C.V.	2
2	LACERBA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	2
3	CONSTRUCTORA RAL DE OCCO S.A.	2
4	INFRACON	2
5	CIMESA	2






Comisión Estatal del Agua Jalisco

Gobierno del Estado de Jalisco
 Comisión Estatal del Agua de Jalisco
 Dirección Técnica

Licitación Pública Nacional
 CEA-CON-EST-LP-017-19

1

6	SUPERKATE SA DE CV	2	3
7	AQUACASA Ingeniería Ambiental SA	2	3
8	GB Ingenieros Civiles	2	3
9	Grupo Constructor de la Región	2	3
10	Pionera y Desarrolladora Mexicana SA	2	3
11	Proyectos Industriales y Urbanos	2	3
12	ARQ. ARMANDO LIZARDE	2	3
13	Proyecto Constructora SA de CV	2	3
14	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SATEL	2	3
15	Grupo Constructor Avia s.a de c.v	2	3
16	Arq. Alejandro Luis Rodriguez GLO	2	3
17	DR. LUCEVALERIA M. ESTEBAN	2	3
18	CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	2	3
19	CONSTRUCCIONES e Ingeniería Costa Alegre S.A. de CV	2	3
20	DESARROLLADORA GNL SAC	2	3
21	CONSTRUCCIONES PIRELLI SA de CV	2	3
22			
23			

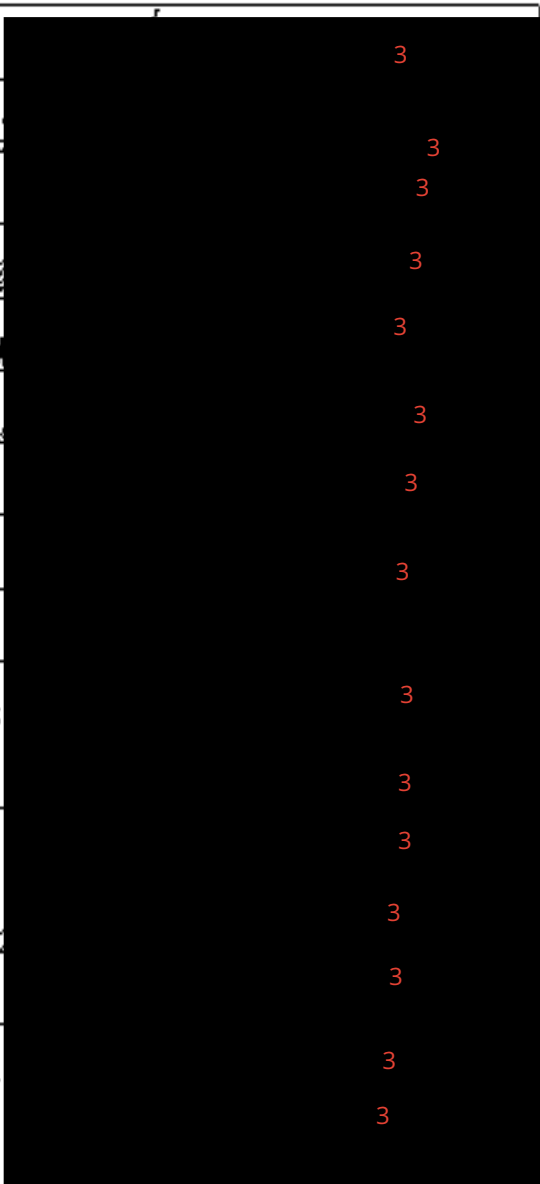



Comisión Estatal del Agua Jalisco

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CEA-CON-EST-LP-017-19

24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

1

1



